Gestion de projet et des organisations

SAE 2.05
Melissa FELOUAH
Nargisse NAAMAN

étude de cas: *“Un séjour découverte en groupe”*

Cahier des charges 4
Les Acteurs 6
Les parties prenantes 6
Le Chef De Projet 7
Ses Missions 7
Ses Compétences et Qualités: 7
Acteurs De L'équipe de Projet 8
Les Acteurs 9
Les parties prenantes 9
Le Chef De Projet 10
Ses Missions 10
Ses Compétences et Qualités: 11
Acteurs De L'équipe de Projet 11
Organigramme Des Tâches (WBS) 12
Livrables 13
Affectation Des Ressources 13
Ressources matérielles 14
Diagramme GANTT de TÂCHES 14
Jalons clés : 14
"Sur-utilisation" des ressources 14
Contrôles et Indicateurs de Suivi de l'Avancement 15
Ce qui sera contrôlé : 15
Indicateurs de suivi : 15
Points d'Avancement et Fréquence 15
Avec qui faire les points d'avancement ? 15
Fréquence des points d'avancement : 15
Critères Qualité et Indicateurs Mesurés 16
Critères à contrôler : 16
Mesures et Indicateurs : 16
Actions en cas de non-respect du plan prévu 16
Solutions et décisions en cas d'écart 16
Qui réunit-on pour ajuster le projet ? 17
Cout 17
1. Choix de la destination 17
2. Budget Global Disponible 17
3. Catégories de dépenses 17
A. Transport 17
B. Hébergement 17
C. Alimentation 17
D. Activités et Loisirs 18
E. Divers et imprévus 18
4. Synthèse des Coûts 18
5. Justification des Coûts 18
1. Liste des Risques Potentiels 19

2. Risques Pertinents Sélectionnés 19
3. Probabilité et Impact des Risques 19
Les 10 questions à se poser pour réussir ce projet 21
Les 3 principales difficultés de ce projet 22
Chances que ce projet aboutisse respectant Qualité, Coût, Délai 22
Profil "idéal" pour être chef de ce projet 23

Le **"demandeur"** du projet est la présidente du club étudiant *"explorateurs 2.0*", **Melissa**. **Les clients**, c'est-à-dire ceux qui vont bénéficier de ce service sont les membres de ce club, spécifiquement ceux qui font partie d'un groupe de **20 membres** (dont 15 ont confirmé leur participation). **Le sponsor** est l'individu qui a aidé à financer le séjour avec une somme de 500 euros *à la condition* que le séjour inclut un reportage photo ou vidéo mettant en valeur l'esprit du club.

Ce projet peut-être décrit en quelques étapes:
-Organiser un séjour découverte de **cinq jours** pour un groupe d'élèves faisant partie du club "Explorateurs de 2.0" entre le 15 et 20 mai.
-Choisir une région dans laquelle va se dérouler le voyage.
-Proposer des **activités** culturelles et sportives qui puissent **satisfaire** les exigences des participants.
-Gérer un budget de **9500 euros** tout en comptabilisant les contributions individuelles et la somme de **500 euros** de sponsor. Ce budget doit couvrir toutes les dépenses et même les **imprévus**.
-Réserver un **lieu d'hébergement** qui répond aux besoins du groupe. Choix entre un gîte de groupe, une auberge de jeunesse ou un camping.
-**Prévoi**r des repas pour limiter les coûts tout en respectant les besoins alimentaires des participants telle que Yasmine qui est végétarienne.
-Organiser **une réunion** avant une semaine de la date du départ pour une bonne organisation et pour se mettre d'accord sur plusieurs choses,notamment la répartition des tâches et choisir les idées qui convient la majorité des étudiants.
-Prendre en compte les critères de confort et d'organisation pour maximiser **la satisfaction** des participants.
-Prévoir des **alternatives et des solutions** en cas de mauvais temps afin d'assurer le bon déroulement des activités .

Cahier des charges

En ce qui concerne les contraintes et exigences on peut énumérer les suivantes:

Contraintes	Limites du projet
-activités: au moins 3 activités principales par jour -temporalité: le séjour doit avoir lieu entre le **15 et le 20 mai**, sur 5 jours. -disponibilités: 1. Certains élèves arriveront plus tard au séjour, (ex: le 16 mai) ce qui peut poser des problèmes de réservation d'hébergement et d'activités collectives. 2. certaines personnes risquent de ne pas participer à la réunion d'organisation 3. c'est un club composé de 20 membres mais seulement 15 personnes ont confirmé leur participation à ce séjour. -climatique: être en mois de mai signifie que 29% du temps risque d'être menacé par la pluie ce qui peut entraver le bon déroulement de certaines activités. -budgétaire: ne pas dépasser les 9500 **euros** avec **300 euros** (déjà inclus) pour chaque candidat max. Et dans ce cas là on doit accepter la subvention du sponsor ce qui imposerait une autre condition: **la réalisation d'un reportage photo ou vidéo au sujet du club**. Ça ajouterait des contraintes telles que: qui va filmer quoi? quand et comment? On pourrait aussi avoir des **coûts supplémentaires** à cause des oublis d'affaires personnelles. -prévoir d'autres contraintes selon le choix	-9500 euros de budget (au mieux) -on ne peut pas prolonger ou raccourcir le séjour. -on ne peut pas dépasser 8h de trajet, encore moins d'affilé (pour l'aller et le retour) -les hébergement ne peuvent pas être réservé à la dernière minute -on ne peut pas satisfaire les préférences de quelques personnes pour le choix d'activités, de transport, d'hébergement au dépit de la majorité

de la région. -de même pour le choix de l'hébergement + prévoir des réservations anticipés. -transport: choix de transport, durée de trajet qui ne peut pas excéder 8h + Paul ne pas les faire d'affilée en raison de ses problèmes de santé. Dans le cas où le trajet se fait au moyen de la voiture de Paul, une participation à l'essence et l'entretien sera requise.	

En ce qui concerne **le phasage du projet**, on peut définir son périmètre selon 3 critères clés ordonnées selon leur ordre de priorité:

1) **COÛT**: le budget n'est pas flexible
2) **DÉLAI**: il a été souligné de façon explicite que le séjour doit respecter le délai qui lui a été originellement souscris
3) **QUALITÉ**: La présidente exige un séjour satisfait par la majorité des participants

exigences fonctionnelles:

-les activités se doivent d'être adaptés aux centres d'intérêt du groupe (donc variés)
-choisir une destination cohérente avec les centres d'intérêt des participants.
-Réserver un hébergement adapté
-Prévoir 3 repas par jours
-Proposer au moins 3 activités par jours (sportives, culturelles et gastronomiques)
-Choisir un moyen de transport respectant la limite de 8h de trajet
-Réaliser un reportage photo/vidéo pour répondre à la demande du sponsor
-Organiser une réunion de préparation le 8 mai
-Faire en sorte que chaque membre fournit la liste, le poids et le nombre de sacs de ses équipements personnels pour éviter des oublis et limiter les coûts supplémentaires.
-Répartir des tâches selon la disponibilités, compétences et intérêts de certains membres de l'équipe

exigences non fonctionnelles:

-Choix des activités :trouver un compromis pour que Clara et Aminata puissent profiter respectivement **d'activités sportives et culturelles**.
De même avec Fatou qui souhaite un **séjour calme** alors que Hugo et Zied veulent organiser une **soirée musicale**.
-La présidente qui souhaite un séjour parfaitement organisé

-**hébergement confortable** (donc pas de camping) pour Paul

-régime alimentaire de Yasmine: végétarienne

Objectifs SMART

Afin de pouvoir mettre la main sur des indicateurs qui nous permettront de mesurer le degré de concrétisation des objectifs et ainsi de les mettres en effet de façon pragmatique, nous avons besoin de définir ces exigences fonctionnelles en objectifs **SMART**:

Spécifique

-Organiser un séjour de 5 jours entre **le 15 et 20 mai** pour **15 membres confirmés** du club **Explorateurs 2.0**.
-Offrir un programme équilibré entre **activités culturelles et sportives**, répondant aux attentes des participants.
-Respecter les **contraintes alimentaires, physiques et logistiques** des participants.
Réaliser un **reportage photo/vidéo** valorisant le club pour satisfaire la condition du sponsor.

Mesurable

-3 activités principales par jour (minimum) à planifier.
-Respect du budget total de 9 500 €, incluant la subvention de **500 €** et la contribution individuelle de **300 € max** par participant.
-Temps de trajet limité à 8h, avec pauses si nécessaire pour Paul.
-Taux de satisfaction des participants mesuré après le séjour via un sondage interne (au moins 80%)

Temporel

-Séjour fixé entre **le 15 et 20 mai** (non flexible).
-Réunion d'organisation **au plus tard le 8 mai**.
-Réservations d'hébergement et transport avant une date limite (ex. 1er mai).
-Tâches attribuées avant le départ, avec deadlines précises.

Les Acteurs

Les parties prenantes

Les parties prenantes du projet "un séjour en découverte en groupe" peut se diviser en deux catégories:

Les parties prenantes dites "favorable" (qui soutiennent le projet):

-Mélissa: Présidente du club "Explorateur 2.0", elle est la demandeuse du projet et s'occupe de son organisation.
-Le sponsor: Apporte un financement de 500 euros sous condition de la réalisation d'un reportage.
Les participants: 15 membres du club ont confirmé leur participation, ce qui assure la viabilité du projet.

Les organisateurs: Aident à la mise en place et à la gestion du séjour.

Et celles qui sont plutôt “hostiles” et cherchent à entraver le bon déroulement du projet:

-Yasmine: Végétarienne, nécessitant un régime alimentaire spécial.
-Paul: Exige un hébergement confortable et ne veut pas faire de trajet trop long d'affilée.
-Clara et Aminata: En désaccord sur les activités (l’une préfère les activités sportives, l’autre les visites culturelles).
-Fatou: S'oppose à l’organisation d’une soirée musicale alors que d’autres participants la souhaitent.

Le Chef De Projet

Melissa est la cheffe de projet non seulement parce qu’elle est la présidente du club “Explorateurs 2.0” mais qu’elle est aussi à l’origine du projet. Cela signifie qu’elle a une vue d’ensemble, qu’elle est en charge de l’organisation générale et qu’elle porte la responsabilité du bon déroulement du séjour.

Ses Missions

Le chef de projet a notamment pour mission d'assurer:

-La **préparation**, la **planification,** la **coordination** et **l'organisation** du projet
-> Organiser le séjour en choisissant la destination, le transport, l’hébergement et les activités.

-La **gestion des ressources** internes et externes affectées au projet
-> Gérer un budget de 9 500 € (en veillant à ne pas dépasser la contribution maximale de 300 € par participant).

La gestion **technique** (expertises internes et externes), **administrative** et **financière** du projet
->Réaliser un reportage photo/vidéo pour obtenir la subvention du sponsor

.-La **relation** avec tous les interlocuteurs du projet
-> Résoudre les conflits entre les participants pour s’assurer que le séjour convienne à la majorité.

-Le **contrôle de la faisabilité** et des chances d'aboutissement du projet
-> Anticiper et gérer les imprévus (météo, problèmes logistiques, etc.).

Ses Compétences et Qualités:

-Maîtrise de **l’organisation** afin de pouvoir structurer de façon optimale le projet et attribuer de façon appropriée **les responsabilité**s à chaque membre de l’équipe de projet.
-Capable de gérer et respecter un **budget** alloué.

-Capable de **négocier** tout en restant diplomate afin de trouver des **compromis** entre les préférences des participants.
-Fait tout pour **anticiper** en cas d'**imprévus** et être assez réactif lorsqu'ils se produisent
-**Communique** suffisamment avec tous les acteurs du projet pour assurer une bonne **coordination** entre ces derniers

Acteurs De L'équipe de Projet

Les acteurs qui composeront **la matrice RACI** sont:

-Le Sponsor
-Mélissa
-Les parties prenantes

Cependant les acteurs principaux qui vont constituer l'**équipe de projet** sont:

-Mélissa (cheffe de projet), qui supervise et organise tout le séjour.
-Paul, qui s'occupe du transport et veille au respect de ses contraintes médicales.
-Yasmine, qui veille à l'adaptation des repas pour les végétariens.
-Clara & Aminata, qui sélectionnent les activités principales du séjour.
-Hugo & Zied, qui organisent la soirée musicale et veillent à ne pas déranger Fatou.

Matrice RACI

Tâches /activités	Cheffe de projet (Mélissa)	Participants (Paul, yasmine, Clara, Aminata, hugo, Zied, Fatou)	Sponsor	Parties prenantes élargies (le Club et non-participants)
Choix de la destination	R / A	C	I	I
Organisation du transport	A	R (paul) / C	I	I
Réservation de l'hébergement	R	C	I	I
Gestion du budget (9500 euros)	R	C	I	I
Planification des repas (dont régimes spéciaux)	A	R (Yasmine) / C	I	I
Organisation	C	R (Clara &	I	I

des activités principales		Aminata) / C		
Organisation d'une soirée musicale	C	R (Hugo & Zied), C (Fatou pour le compromis)	I	I
Réalisation du reportage photo/vidéo (pour le sponsor)	R	C	A	I
Organisation de la réunion du 8 mai	R	I	I	I
Communication avec tous les participants	R	I	I	I
Préparation des listes d'équipements personnels	C	R	I	I
Anticipations et gestion des imprévus (santé, météo, etc…)	R	C	I	I

Légende RACI

R = Responsable : Celui qui exécute la tâche.

A = Autorité / Approuve : Celui qui valide le travail ou prend la décision finale.

C = Consulté : Apporte son avis ou expertise.

I = Informé : Tenu au courant, mais pas impliqué directement.

Les Acteurs

Les parties prenantes

Les parties prenantes du projet "un séjour en découverte en groupe" peut se diviser en deux catégories:

Les parties prenantes dites “favorable” (qui soutiennent le projet):

-Mélissa: Présidente du club “Explorateur 2.0”, elle est la demandeuse du projet et s’occupe de son organisation.
-Le sponsor: Apporte un financement de 500 euros sous condition de la réalisation d’un reportage.
Les participants: 15 membres du club ont confirmé leur participation, ce qui assure la viabilité du projet.
Les organisateurs: Aident à la mise en place et à la gestion du séjour.

Et celles qui sont plutôt “hostiles” et cherchent à entraver le bon déroulement du projet:

-Yasmine: Végétarienne, nécessitant un régime alimentaire spécial.
-Paul: Exige un hébergement confortable et ne veut pas faire de trajet trop long d'affilée.
-Clara et Aminata: En désaccord sur les activités (l’une préfère les activités sportives, l’autre les visites culturelles).
-Fatou: S'oppose à l’organisation d’une soirée musicale alors que d’autres participants la souhaitent.

Le Chef De Projet

Melissa est la cheffe de projet non seulement parce qu’elle est la présidente du club “Explorateurs 2.0” mais qu’elle est aussi à l’origine du projet. Cela signifie qu’elle a une vue d’ensemble, qu’elle est en charge de l’organisation générale et qu’elle porte la responsabilité du bon déroulement du séjour.

Ses Missions

Le chef de projet a notamment pour mission d'assurer:

-La préparation, la planification et l'organisation du projet
-> Organiser le séjour en choisissant la destination, le transport, l’hébergement et les activités.

-La gestion des ressources internes et externes affectées au projet
-> Gérer un budget de 9 500 € (en veillant à ne pas dépasser la contribution maximale de 300 € par participant).

La gestion technique (expertises internes et externes) administrative et financière du projet
->Réaliser un reportage photo/vidéo pour obtenir la subvention du sponsor

.-La relation avec tous les interlocuteurs du projet
-> Résoudre les conflits entre les participants pour s’assurer que le séjour convienne à la majorité.

-Le contrôle de la faisabilité et des chances d'aboutissement du projet
-> Anticiper et gérer les imprévus (météo, problèmes logistiques, etc.).

Ses Compétences et Qualités:

-Maîtrise de l'organisation afin de pouvoir structurer de façon optimale le projet et attribuer de façon appropriée les responsabilités à chaque membre de l'équipe de projet.
-Capable de gérer et respecter un budget alloué.
-Capable de négocier tout en restant diplomate afin de trouver des compromis entre les préférences des participants.
-Fait tout pour anticiper en cas d'imprévus et être assez réactif lorsqu'ils se produisent
-Communique suffisamment avec tous les acteurs du projet pour assurer une bonne coordination entre ces derniers

Acteurs De L'équipe de Projet

Les acteurs qui composeront la matrice RACI sont:

-Le Sponsor
-Mélissa
-Les participants
-Paul
-Clara & Aminata
-Hugo & Zied
-Yasmine

Cependant les acteurs principaux qui vont constituer l'équipe de projet sont:
-Mélissa (cheffe de projet), qui supervise et organise tout le séjour.
-Paul, qui s'occupe du transport et veille au respect de ses contraintes médicales.
-Yasmine, qui veille à l'adaptation des repas pour les végétariens.
-Clara & Aminata, qui sélectionnent les activités principales du séjour.
-Hugo & Zied, qui organisent la soirée musicale et veillent à ne pas déranger Fatou.

Organigramme Des Tâches (WBS)

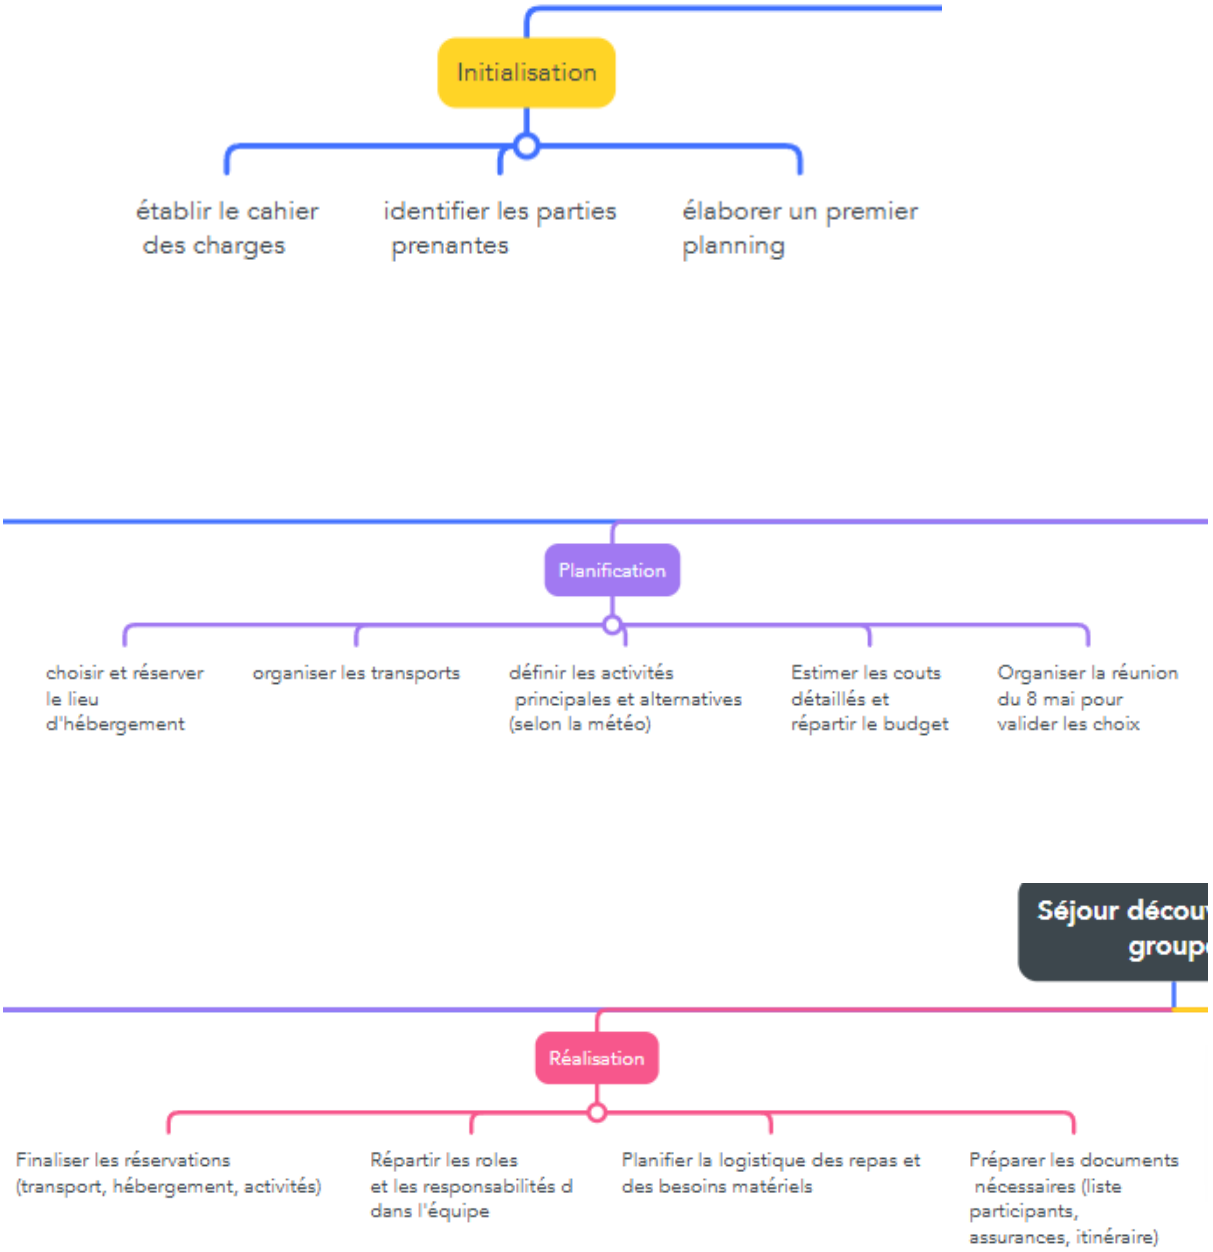

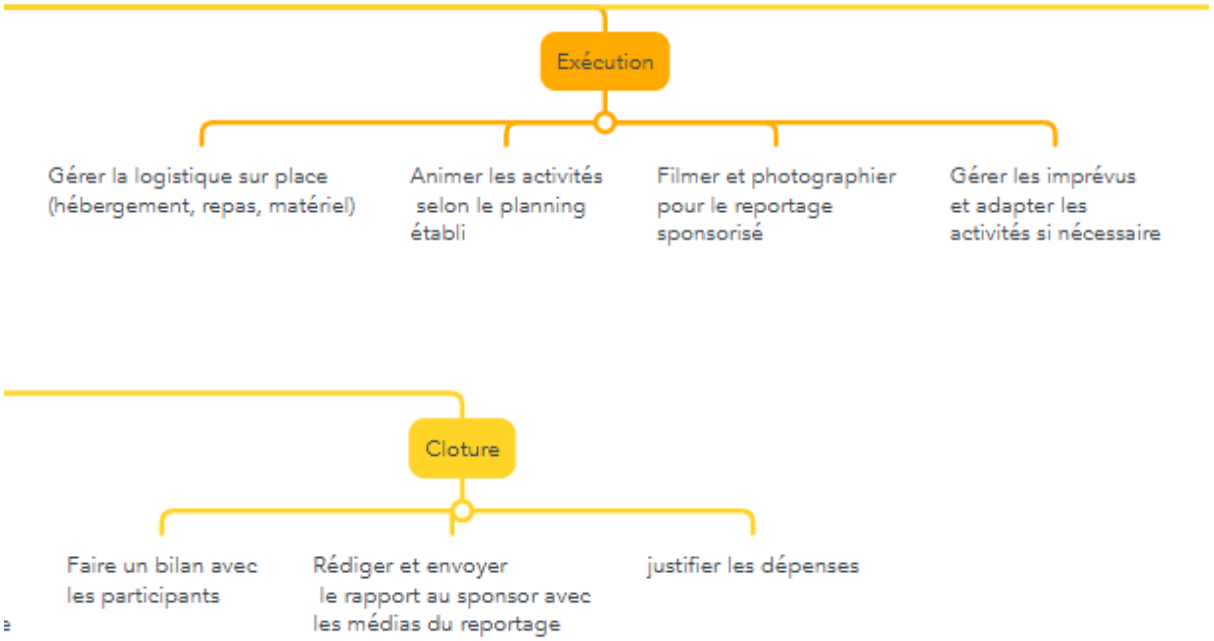

Livrables

Élaboration du cahier des charges : Cahier des charges finalisé.
Identifier les parties prenantes : Une liste des parties prenantes avec leurs rôles respectifs.
Planification générale : Un planning prévisionnel du séjour.
Réservation de l'hébergement : Une confirmation de réservation.
Organisation du transport : Billets ou confirmations de réservation.
Planification des activités : Un programme détaillé des activités.
Élaboration du budget : Un document détaillant la répartition budgétaire.
Répartition des rôles : Une liste des responsabilités assignées à chaque personne.
Élaboration de la check-list des besoins : Un fichier logistique répertoriant tous les besoins.
Reportage vidéo/photo : Des photos et vidéos validées.
Rapport de bilan : Un document de retour d'expérience avec des recommandations.
Justification des dépenses : Un document comptable finalisé.

Affectation Des Ressources

Planification générale : Mélissa
Réservations :

-Paul (transport)

-Clara (activités)

-Fatou (hébergement)

Budget : Mélissa et le Trésorier du club
Organisation logistique : Groupe (répartition des tâches)
Communication avec les participants : Mélissa
Reportage photo/vidéo : Hugo et Zied
Bilan du séjour : Tous les membres + Mélissa

Ressources matérielles

Budget total : 9 500 €, tableau Excel ou logiciels de comptabilité

Transport : Train/BUS

Hébergement : Chalets ou auberge

Activités : Randonnée, visites, soirée musicale

Matériel : Appareils photo, trépieds, équipements sportifs

Diagramme GANTT de TÂCHES

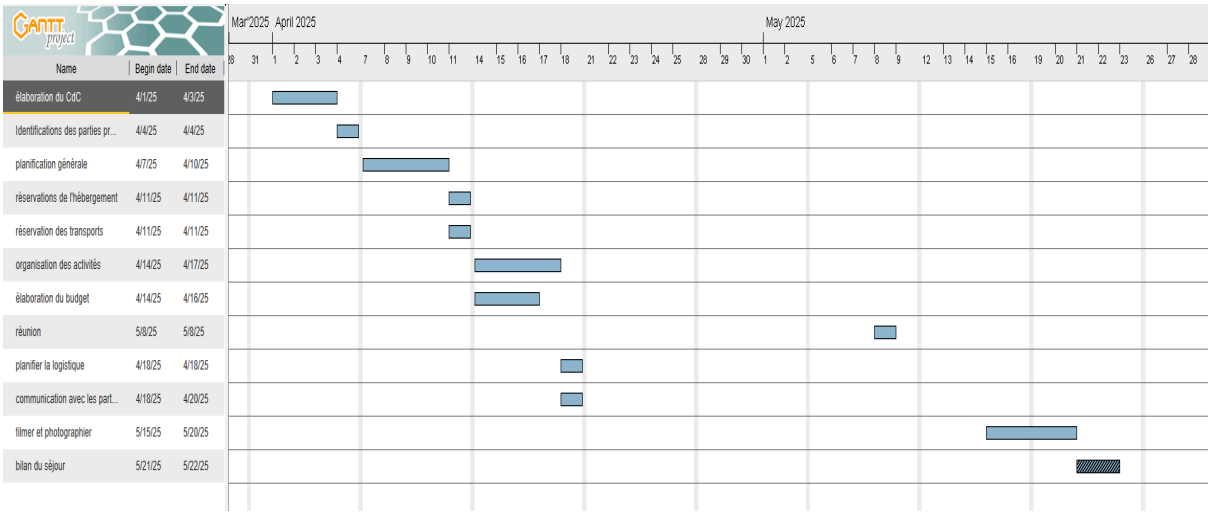

Jalons clés :

15 mai : Départ du séjour (moment clé)

8 mai: réunion pour valider les choix

20 mai : Retour et bilan du séjour

"Sur-utilisation" des ressources

Il faut veiller à être sur à ce que Mélissa, qui a beaucoup de responsabilités, ne soit pas surchargée. Pour cela, elle pourrait donc avoir besoin d'un soutien pour des tâches comme la communication avec les participants ou l'organisation logistique.

Par ailleurs, Hugo et Zied doivent être disponibles en mai pour le reportage photo/vidéo, mais ils ne devraient pas avoir d'autres tâches parallèles pendant cette période.

Contrôles et Indicateurs de Suivi de l'Avancement

Ce qui sera contrôlé :

Respect du budget : Suivi des dépenses et ajustements si nécessaire.

Disponibilité des ressources : Confirmation des réservations (transport, hébergement, activités).

Respect du planning : Assurance que les activités et déplacements se déroulent selon le programme prévu.

Satisfaction des membres : Enquêtes et retours sur l'organisation.

Gestion des imprévus : Adaptation aux problèmes de météo, annulations, etc.

Indicateurs de suivi :

Avancement financier : Utilisation de la méthode de la valeur acquise (EVM) pour suivre les coûts.

Avancement des tâches : Tableau de suivi des étapes du projet.

Satisfaction des participants : Sondages rapides (avant, pendant et après le séjour).

Gestion des risques : Nombre de problèmes résolus vs problèmes imprévus.

Points d'Avancement et Fréquence

Avec qui faire les points d'avancement ?

Melissa (présidente du club) : Validation et arbitrage des choix stratégiques.

Participants: Information et ajustements collectifs.

Chef de projet : Suivi opérationnel et synthèse des progrès.

Fréquence des points d'avancement :

Avant le séjour :

Réunions hebdomadaires (en visio si besoin)

Un dernier briefing une semaine avant le départ.

Pendant le séjour :

Briefing quotidien chaque matin.

Point rapide en fin de journée pour ajustements.

Après le séjour :

Débriefing et retour d'expérience une semaine après.

Critères Qualité et Indicateurs Mesurés

Critères à contrôler :

Adéquation aux attentes des participants : Variété et adaptabilité des activités.

Respect du budget : Différence entre prévisionnel et réel.

Organisation et logistique : Fluidité du séjour et respect des horaires.

Confort et accessibilité de l'hébergement : Conformité avec les attentes des participants (ex. Paul).

Satisfaction globale : Score moyen des retours post-séjour.

Mesures et Indicateurs :

Temps moyen de **réalisation des activités vs planning initial.**

% de satisfaction des membres sur différents critères (logement, activités, transport, restauration).

Nombre d'incidents logistiques et délais non respectés.

Comparaison prévisionnel / réel des coûts (**méthode EVM**).

Actions en cas de non-respect du plan prévu

Solutions et décisions en cas d'écart

Budget supérieur au prévu : Réallocation des fonds, recherche de sponsors ou contributions volontaires.

Retards dans le programme : Suppression ou remplacement d'activités.

Météo défavorable : Prévoir des activités intérieures en plan B.

Désaccords entre membres : Arbitre entre intérêts divergents (Clara/Aminata, Paul/camping, Hugo/Fatou).

Qui réunit-on pour ajuster le projet ?

Melissa (présidente) : Décisions stratégiques.

Membres du club (réunion rapide si besoin) : Acceptation des ajustements.

Chef de projet : Proposition et mise en œuvre des ajustements pratiques.

Cout

Estimation du Coût du Projet : Séjour Découverte en Groupe

1. Choix de la destination

Destination retenue : La Bretagne

Justification : Compromis entre activités culturelles, découvertes naturelles et loisirs sportifs.

2. Budget Global Disponible

Total : 9500 euros

3. Catégories de dépenses

A. Transport

Location d'un minibus pour 5 jours : 600 €

Carburant et péages (Paris - Bretagne aller-retour + trajets internes) : 400 €

Participation pour la voiture de Paul : 200 €

Total Transport : 1 200 €

B. Hébergement

Location d'un gîte pour 5 nuits (15 personnes) : 2 000 €

Total Hébergement : 2 000 €

C. Alimentation

Courses alimentaires (repas collectifs) : 600 €

Options végétariennes et régimes spécifiques : 100 €

Restaurants occasionnels : 300 €

Total Alimentation : 1 000 €

D. Activités et Loisirs

Visites culturelles (musées, monuments) : 150 €

Activités sportives (kayak, randonnées guidées) : 250 €

Soirée musicale (location de matériel) : 100 €

Total Activités : 500 €

E. Divers et imprévus

Assurances et frais annexes : 200 €

Fonds de secours en cas d'imprévu : 100 €

Total Divers : 300 €

4. Synthèse des Coûts

Catégorie	Montant (€)
Transport	1 200
Hébergement	2 000
Alimentation	1 000
Activités	500
Total	5000 euros

5. Justification des Coûts

La rentabilité du projet repose sur la satisfaction des participants, le renforcement de la cohésion du groupe et la production d'un reportage photo/vidéo pour le sponsor.

La gestion des coûts a été optimisée en privilégiant un hébergement collectif et en limitant les dépenses superflues.

Une marge d'imprévu de 300 € est prévue pour garantir la stabilité financière du projet.

Risque

Gestion des Risques : Séjour Découverte en Groupe

1. Liste des Risques Potentiels

1. Annulation de dernière minute d'un participant
2. Intempéries affectant les activités extérieures
3. Panne du véhicule de Paul ou du minibus
4. Retard ou absence d'un participant lors des départs
5. Problèmes alimentaires pour Yasmine
6. Conflits entre participants sur le choix des activités
7. Accident ou blessure pendant une activité
8. Problèmes de réservation ou d'hébergement
9. Perte ou vol d'objets personnels
10. Budget insuffisant à cause de dépenses imprévues

2. Risques Pertinents Sélectionnés

1. Intempéries
2. Panne du véhicule
3. Retard ou absence d'un participant
4. Problèmes alimentaires
5. Conflits entre participants
6. Accident/blessure
7. Problèmes de réservation
8. Budget insuffisant
9. Perte ou vol d'objets
10. Annulation d'un participant

3. Probabilité et Impact des Risques

Description du risque	# Probabilité du risque	Action préventive	Action corrective	Notation impact	Impact sur le projet (coût, délai, qualité)
Conflit entre participants sur les activités (sport vs culture)(Clara et Aminata	0.5	Réaliser un sondage pour équilibrer les activités	Répartir les activités sur différents jours	0.2	Tension dans le groupe, perte de motivation (qualité)
Météo imprévisible perturbant les activités en plein air(29% du temps menacé)	0.7	Prévoir des activités de repli en intérieur	Reprogrammer les activités en intérieur	0.3	Retards, perte de temps, insatisfaction (qualité, délai)
Soirée lusicale qui perturbe fatou	0.5	Prévoir une place calme dans la soirée dans un lieu apart	écourter la soirée si des attentions apparaissent	0.2	gene ou conflit dan sle groupe(qualité, durée)
Régime alimentaire spécifique de Yasmine	0.6	Prévoir un menu personnalisé en amont	Achat de repas spécifiques sur place	0.2	Retards ou erreurs dans les repas (qualité, coût)
Problème de transport lié à la limite de conduite de Paul	0.5	Choisir un lieu proche ou prévoir un autre conducteur	Utiliser un autre moyen de transport	0.4	Allongement du trajet ou désorganisation (délai)
Désistement de dernière minute pour l'hébergement	0.3	Réserver des logements avec annulation gratuite	Réaffecter le logement ou remplacer la personne	0.2	Perturbation logistique ou surcoût (coût)
Membres absents à la réunion d'organisation	0.6	Planifier une réunion en ligne + compte-rendu écrit	Faire un résumé et l'envoyer à tous	0.1	Mauvaise coordination (délai)
Dépassement du budget prévu (5000€)	0.4	Prévoir une marge budgétaire de sécurité	Réduire les activités moins prioritaires	0.4	Baisse de qualité du séjour ou d'activité (qualité, coût)
Retard de certains participants (dispo après le 16 mai)	0.5	Adapter le planning aux arrivées échelonnées	Réorganiser les activités prévues le premier jour	0.3	Activités réduites ou modifiées (qualité, délai)
Refus de camping par certains membres (paul)	0.5	Choisir un gîte confortable et non un camping	Changer d'hébergement en urgence	0.3	Conflits, perte de confort (qualité)
Trop de bagages ou oublis matériels par les membres	0.4	Demander une liste précise des équipements à l'avance	Acheter les équipements oubliés sur place	0.2	Oublis ou surcharge du véhicule (qualité, coût)
vidéo/reportage non réalisé(perte de la subvention de 500 euro)	0.3	Désigner un reesponsable pour la vidéo et une bonne caméra	Réaliser un montage à partir des photos prises par tout les mem	0.4	perte de 500 euro de subvention (cout)

Synthèse

Les 10 questions à se poser pour réussir ce projet

1.Quel est l'objectif principal et mesurable de ce séjour?

-> Cela aide à prioriser lors des choix difficiles

2.Qui sont toutes les parties prenantes et quelles sont leurs attentes/contraintes prioritaires?

-> Essentiel pour la gestion des attentes et la qualité perçue.

3.Quelles sont les exigences *non négociables* (qualité, coût, délai) et lesquelles ont une marge de flexibilité ?

-> Permet de savoir où faire des compromis.

4.Quel est le budget *détaillé* et réaliste pour chaque poste de dépense ?

-> Le diable est dans les détails pour respecter le budget.

5.Quelles sont les échéances *critiques* pour les décisions et réservations clés ?

-> Assurer le respect du délai final

6.Qui est responsable de quoi (RACI) et comment la coordination et la communication entre les responsables de tâches seront-elles assurées ?

->Pour éviter les oublis et les doublons

7.Quels sont les 3-5 risques *majeurs* (probabilité x impact) et quelles actions *préventives* et *correctives* concrètes sont prévues ?

-> Anticiper pour mieux réagir.

8.Comment mesurons-nous le succès du projet (indicateurs clés) pendant et après le séjour ?

-> Permet d'ajuster le tir si besoin.

9.Comment la communication sera-t-elle gérée avec tous les participants avant, pendant et après le séjour pour assurer la transparence et l'engagement ?

->Maintient la cohésion et gère les attentes.

10.Comment le projet sera-t-il documenté pour en tirer des leçons pour de futurs événements ?

-> Cela pourrait inclure un bilan écrit ou des retours post-séjour.

Les 3 principales difficultés de ce projet

1. **La gestion des attentes et contraintes divergentes des participants** : C'est un défi majeur pour l'objectif "Qualité". Satisfaire simultanément Paul (confort, trajet), Yasmine (végétarienne), Clara (sport) vs Aminata (culture), Fatou (calme) vs Hugo/Zied (soirée), tout en visant la satisfaction de la *majorité* et en respectant les autres contraintes, demande une excellente négociation, planification et communication. Le risque de mécontentement d'une partie du groupe est élevé.
2. **Le respect strict du budget (Coût)** : 9500€ pour 15+ personnes sur 5 jours, incluant transport (potentiellement minibus + voiture), hébergement (hors camping), 3 repas/jour (avec spécificités), 3 activités/jour, le matériel pour le reportage et les imprévus, semble très serré. La nécessité d'accepter le sponsoring (et sa contrainte de reportage) pour boucler le budget le confirme. Le risque de dépassement est important.
3. **La complexité logistique et organisationnelle dans un délai court** : Coordonner le choix de la destination,, le transport (<8h, pauses pour Paul), l'hébergement adapté, les repas pour tous, un programme d'activités dense et varié, le reportage photo/vidéo, tout en gérant les arrivées potentiellement décalées et en préparant la réunion du 8 Mai pour un départ le 15 Mai, demande une organisation sans faille et une grande réactivité, surtout pour une équipe étudiante.

Chances que ce projet aboutisse respectant Qualité, Coût, Délai

Estimation : **60%**

Délai : Les dates sont fixes (15-20 mai), ce qui est un point d'ancrage fort. La réunion clé du 8 mai doit permettre de valider les derniers points. Le risque principal identifié est un retard dans la planification *avant* cette date, ce qui compliquerait ou renchérirait les réservations.

Notre confiance dans le respect du délai est assez élevée (80%), à condition que la planification soit irréprochable.

Coût : Le budget est certes fixe, mais il me semble très tendu au vu de ce que nous souhaitons offrir (hébergement confortable, 3 activités/jour, transport, nourriture variée, reportage, imprévus). Notre estimation initiale des coûts (5000€) nécessiterait d'être affinée et validée, car elle paraît optimiste. Le risque de devoir soit réduire la qualité/les activités, soit de solliciter une rallonge (si possible), me paraît très élevé.

Nous considérons la probabilité de respecter strictement ce budget comme faible (40%), sans une gestion extrêmement serrée et d'éventuels sacrifices.

Qualité: L'objectif de satisfaire la *majorité* est complexe à atteindre avec les nombreuses contraintes et désirs divergents (confort de Paul, régime de Yasmine, activités sportives vs culturelles, ambiance calme vs festive). Réaliser le reportage ajoute aussi une contrainte. Trouver des compromis qui satisferont un grand nombre sans laisser trop de déçus sera un défi majeur pour la cohésion et la réussite perçue du séjour.

Notre estimation de la probabilité d'atteindre un bon niveau de satisfaction pour la majorité (tout en respectant les exigences clés) est de 60%.

Profil "idéal" pour être chef de ce projet

Compte tenu des spécificités et des difficultés que nous avons identifiées pour ce séjour, le profil idéal du chef de projet devrait, selon nous, posséder les qualités et compétences suivantes :

-Organisation & Planification : Structuré, anticipe la logistique complexe, respecte le calendrier serré.

-Gestion Budgétaire : Rigoureux avec le budget contraint, suit les dépenses, trouve des solutions économiques.

-Négociation & Diplomatie : Gère les attentes divergentes, facilite les compromis, apaise les conflits.

-Communication & Cohésion : Communique clairement et fédère correctement le groupe.

-Réactivité & Adaptabilité : Gère les imprévus efficacement, prend des décisions rapides.

-(en plus) Suivi Technique (Photo/Vidéo) : Assure la qualité du reportage pour le sponsor.
